15132 / Projektplan Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81 in 45468 Mülheim an der Ruhr

VORABZUG

Hütténes GmbH Architekten
Architektur + Projektsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Start	Ende
1	**Bauleistungen Neubau**	**12.05.2021**	**28.07.2023**
2	Vorleistungen Erdbau (Verdichtung Baufeld)	12.05.2021	04.06.2021
3	**Bohrpfahlgründung**	**07.06.2021**	**03.09.2021**
4	**ELT Umbau/ Neubau Trafo**	**26.07.2021**	**31.08.2021**
5	**Rohbau Gebäude (Betonbau)**	**20.08.2021**	**05.08.2022**
6	Rohbau bis Decke über 3.OG	20.08.2021	27.04.2022
7	Rohbau 4.OG	12.04.2022	18.05.2022
8	Rohbau 5.OG/Dachanschlüsse und Aufbauten	12.05.2022	25.05.2022
9	Umrüstung zum Fassadengerüst für Dach- und Fassadenarbeiten	19.05.2022	10.06.2022
10	Rohbau - Innenausbauten MW, Anschluss TRH 1 Bestand	01.03.2022	27.06.2022
11	spätestees Zeitfenster zur Fertigstellung Rohbau TRH 1 - Anschluß Bestand (Abbruch Wände und Übergang Deckenplatten + Rampe, Stahlbau Vordächer	28.06.2022	05.08.2022
12	frühestes Zeitfenster für erste Rohinstallationen TGA, Zentralen im HG + Krichkeller, Regenentwässerung, Schachteinbauten, Haupttrassen/Befestigungen	28.04.2022	05.09.2022
13	**Dach- und Fassadenarbeiten**	**27.05.2022**	**13.01.2023**
14	Gebäudedicht (ggf. in Teilbereichen für Ausbau)	06.09.2022	06.09.2022
15	**Ausbau Geschoße**	**16.08.2022**	**10.07.2023**
16	Zeitfenster für erste Rohinstallationen TGA, Zentralen im HG + Krichkeller, Regenentwässerung, Schachteinbauten, Haupttrassen/Befestigungen	16.08.2022	10.07.2023
17	**Anpassung RLT Forum**	**02.01.2023**	**17.05.2023**
18	**Umbau Forum, Nebenräume und Reste der Sporthalle**	**02.01.2023**	**10.07.2023**
19	Außenanlagen - Schulhof Neubauteil bzw. in den Ferien Feuerwehrzufahrt mit Wendefläche	17.04.2023	28.07.2023
20	Neubau Inbetriebnahmen, SV-Abnahmen Teilneubau, Umschaltung SiTec HG zu Neuen Zentralen	19.06.2023	28.07.2023
21	Inbetriebnahme Teilneubau, Forum und Sporthalle	31.07.2023	31.07.2023

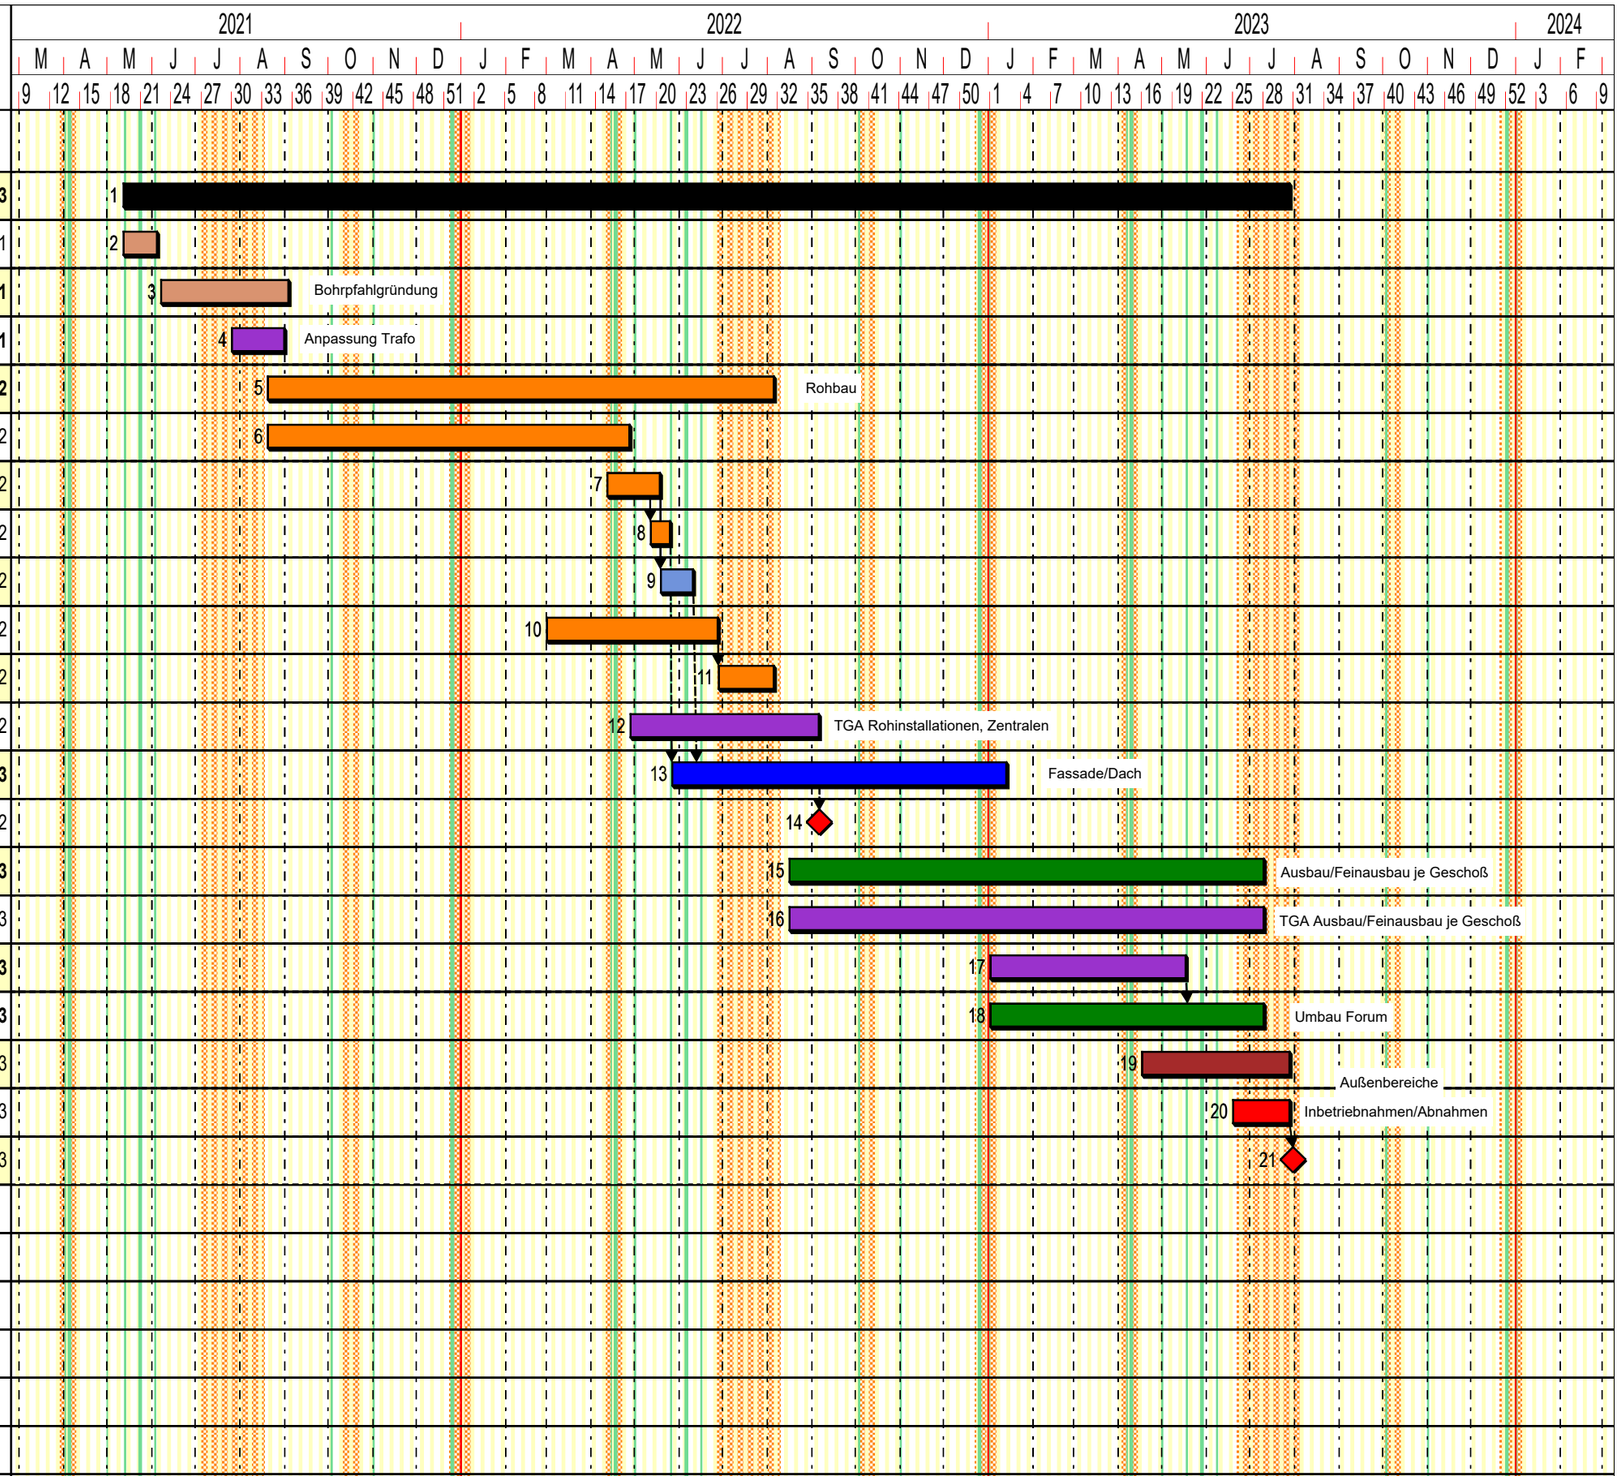

Firmen

Sammelvorgänge | BE, Erdbau, Herrichtung Baufeld | Bohrpfahlgr. | TGA | Rohbau | Gerüstbau | Dach/Fassaden übergeordnet
Meilensteine / Hinweise | Ausbau übergeordnet | Außenanlagen + Freianlagen

DK (Hei, Lr) 22.06.2021
