| Nr. | Vorgangsn | Vorgangsname | Dauer |
|---|---|---|---|
| 0 | | 231127_Hauskampstraße_Bauablauf_Zeitenplan | 194 Tage? |
| 1 | | 1 Auftragsvergabe | 1 Tag |
| 2 | | 2 Allgemein / Technische Bearbeitung | 51 Tage |
| 3 | | 2.1 Objekt- u. Tragwerkspl. (Statik) Überbau | 15 Tage |
| 4 | | 2.2 Prüfung Statik | 5 Tage |
| 5 | | 2.3 Stahlbau-Werkstattpläne, Schal- u. Bewehrungspläne Überbau | 15 Tage |
| 6 | | 2.4 Prüfung Pläne | 3 Tage |
| 7 | | 2.5 Rückbaustatik u. Demontagepläne | 10 Tage |
| 8 | | 2.6 Prüfung Rückbauplanung | 3 Tage |
| 9 | | 2.7 Einrichtung Umleitung u. Verkehrssicherung | 2 Tage |
| 10 | | 2.8 Rückbau Umleitung u. Verkehrssicherung | 2 Tage |
| 11 | | 2.9 Einrichtung BE / BE-Einfriedung | 5 Tage |
| 12 | | 2.10 Rückbau BE / BE-Einfriedung | 5 Tage |
| 13 | | 3 Erd- u. Straßenbauarbeiten | 170 Tage? |
| 14 | | 3.1 bit. Anschluss schneiden | 1 Tag |
| 15 | | 3.2 Übergang fräsen | 1 Tag |
| 16 | | 3.3 bit. Decke aufbrechen u. entfernen | 5 Tage |
| 17 | | 3.4 Randeinfassungen abbrechen u. entfernen | 3 Tage |
| 18 | | 3.5 ungebundene Schichten aufnehmen | 1 Tag? |
| 19 | | 3.6 Leitungsgräben herstellen - VL-Demontage | 20 Tage |
| 20 | | 3.7 Leitungsgräben herstellen - VL-Neuverlegung | 20 Tage |
| 21 | | 3.8 Leitungsgräben herstellen - Rückbau Kanalanschlussleitungen | 20 Tage |
| 22 | | 3.9 Leitungsgräben herstellen - Neuverlegung Kanalanschlussleitungen | 20 Tage |
| 23 | | 3.10 Leitungsgräben schließen- VL-Demontage | 15 Tage |
| 24 | | 3.11 Leitungsgräben - schließen VL-Neuverlegung | 20 Tage |
| 25 | | 3.12 Leitungsgräben schließen - Rückbau Kanalanschlussleitungen | 15 Tage |
| 26 | | 3.13 Leitungsgräben schließen - Neuverlegung Kanalanschlussleitungen | 20 Tage |
| 27 | | 3.14 Erdarbeiten u. Planum herstellen | 1 Tag? |
| 28 | | 3.15 Frostschutzschicht herstellen | 1 Tag? |
| 29 | | 3.16 Bordanlage herstellen | 1 Tag? |
| 30 | | 3.17 Schottertragschicht herstellen | 1 Tag? |
| 31 | | 3.18 bit. Tragschicht herstellen | 1 Tag? |
| 32 | | 3.19 Binderschicht hetsellen | 1 Tag? |
| 33 | | 3.20 Gehwegpflaster herstellen | 1 Tag? |
| 34 | | 3.21 Deckschicht herstellen | 1 Tag? |
| 35 | | 3.22 Bankette herstellen | 1 Tag? |
| 36 | | 4 Versorgungsleitungen | 68 Tage |
| 37 | | 4.1 Maste sichern | 3 Tage |
| 38 | | 4.2 LWL-Kabelprovisorium (Ausführung durch Telekom/Ruhrbahn) | 41 Tage |
| 39 | | 4.3 Leitungen ausbauen | 5 Tage |
| 40 | | 4.4 Leitungsverlegung u. Leitungszone herstellen | 15 Tage |
| 41 | | 4.5 Abzweigkästen versetzen | 5 Tage |
| 42 | | 4.6 Leerrohrverlegung u. Leitungszone hesrstellen | 15 Tage |
| 43 | | 5 Suchgräben | 81 Tage |
| 44 | | 5.1 Prov. Leitungsführungen herstellen | 10 Tage |
| 45 | | 5.2 Leitungsumschlüsse durchführen | 15 Tage |
| 46 | | 6 Kanalbau | 154 Tage? |
| 47 | | 6.1 Straßenabläufe rückbauen | 1 Tag? |
| 48 | | 6.2 neue Straßenabläufe einbauen | 12 Tage |
| 49 | | 6.3 Kanalanschlussleitungen verlegen u. Leitungszone herstellen | 12 Tage |
| 50 | | 6.4 Schachtanschlüsse herstellen | 12 Tage |
| 51 | | 6.5 Schachtabdeckung regulieren | 2 Tage |
| 52 | | 7 Brückenbau | 125 Tage |
| 53 | | 7.1 VFT-Träger im Werk herstellen | 50 Tage |
| 54 | | 7.2 Überbau leichtern | 5 Tage |
| 55 | | 7.3 Kranaufstandsfläche herrichten | 3 Tage |
| 56 | | 7.4 Mobilkran aufstellen | 2 Tage |
| 57 | | 7.5 Überbau demontieren, zerlegen u. abfahren | 5 Tage |
| 58 | | 7.6 Zwischenstütze demontieren, zerlegen u. abfahren | 2 Tage |
| 59 | | 7.7 Mobilkran abbauen | 2 Tage |
| 60 | | 7.8 Baugrube Nord herstellen | 2 Tage |
| 61 | | 7.9 Teilabbruch WL Nord | 2 Tage |
| 62 | | 7.10 Anschluss WL Nord vorbereiten | 2 Tage |
| 63 | | 7.11 Schalung WL-Ergänzung Nord | 5 Tage |
| 64 | | 7.12 Bewehrung WL-Ergänzung Nord | 5 Tage |
| 65 | | 7.13 Betonage WL-Ergänzung Nord | 1 Tag |
| 66 | | 7.14 Ausschalen WL-Ergänzung Nord | 2 Tage |
| 67 | | 7.15 Hinterfüllung mit Sickerschicht WL-Ergänzung Nord | 3 Tage |
| 68 | | 7.16 Baugrubenverfüllung WL-Ergänzung Nord | 2 Tage |
| 69 | | 7.17 Schalung Endquerträger Nord | 5 Tage |
| 70 | | 7.18 Bewehrung Endquerträger Nord | 5 Tage |
| 71 | | 7.19 Baugrube Süd herstellen | 2 Tage |
| 72 | | 7.20 Teilabbruch WL Süd | 2 Tage |
| 73 | | 7.21 Anschluss WL Süd vorbereiten | 2 Tage |
| 74 | | 7.22 Schalung WL-Ergänzung Süd | 5 Tage |
| 75 | | 7.23 Bewehrung WL-Ergänzung Süd | 5 Tage |
| 76 | | 7.24 Betonage WL-Ergänzung Süd | 1 Tag |
| 77 | | 7.25 Ausschalen WL-Ergänzung Süd | 2 Tage |
| 78 | | 7.26 Hinterfüllung mit Sickerschicht WL-Ergänzung Süd | 3 Tage |
| 79 | | 7.27 Baugrubenverfüllung WL-Ergänzung Süd | 2 Tage |
| 80 | | 7.28 Schalung Endquerträger Süd | 5 Tage |
| 81 | | 7.29 Bewehrung Endquerträger Süd | 5 Tage |
| 82 | | 7.30 Vorbereitung Montage VFT-Träger | 3 Tage |
| 83 | | 7.31 Mobilkran aufstellen | 2 Tage |
| 84 | | 7.32 Lieferung u. Bereitstellung VFT-Träger | 10 Tage |
| 85 | | 7.33 VFT-Träger montieren | 2 Tage |
| 86 | | 7.34 Mobilkran abbauen | 2 Tage |
| 87 | | 7.35 Schalung Ortbeton-Fahrbahnplatte | 4 Tage |
| 88 | | 7.36 Bewehrung Ortbeton-Fahrbahnplatte | 5 Tage |
| 89 | | 7.37 Betonage Ortbeton-Fahrbahnplatte u. Endquerträger | 1 Tag |
| 90 | | 7.38 Ausschalen Ortbeton-Fahrbahnplatte u. Endquerträger | 3 Tage |
| 91 | | 7.39 Montage Fahrbahnübergänge | 4 Tage |
| 92 | | 7.40 Ortbeton-Fahrbahnpaltte für Abdichtung vorbereiten | 1 Tag |
| 93 | | 7.41 Ortbeton-Fahrbahnpaltte grundieren u. versiegeln | 4 Tage |
| 94 | | 7.42 Einbau Bitumen-Dichtungsbahn u. Verstärkungen | 1 Tag |
| 95 | | 7.43 Schalung für Kappen herstellen | 5 Tage |
| 96 | | 7.44 Bewehrung Kappen | 4 Tage |
| 97 | | 7.45 Montage Geländerverankerung | 4 Tage |
| 98 | | 7.46 Montage VL-Leerrohre | 4 Tage |
| 99 | | 7.47 Betonage Kappen | 1 Tag |
| 100 | | 7.48 Ausschalen Kappe | 4 Tage |
| 101 | | 7.49 bit. Schutzschicht einbauen | 1 Tag |
| 102 | | 7.50 Gussasphalt-Deckschicht einbauen | 1 Tag |
| 103 | | 7.51 Geländer montieren | 4 Tage |
| 104 | | 7.52 Korrosionsschutz Geländer | 2 Tage |
| 105 | | 8 Straßenausstattung u. Rekultivierung | 12 Tage |
| 106 | | 8.1 Neue Masten setzen | 6 Tage |
| 107 | | 8.2 Markierung herstellen | 3 Tage |
| 108 | | 8.3 Beschilderung aufstellen | 2 Tage |
| 109 | | 8.4 Absturzeinrichtungen u. Zäune versetzen | 5 Tage |
| 110 | | 8.5 Oberboden- u. Rekultivierungsarbeiten | 5 Tage |

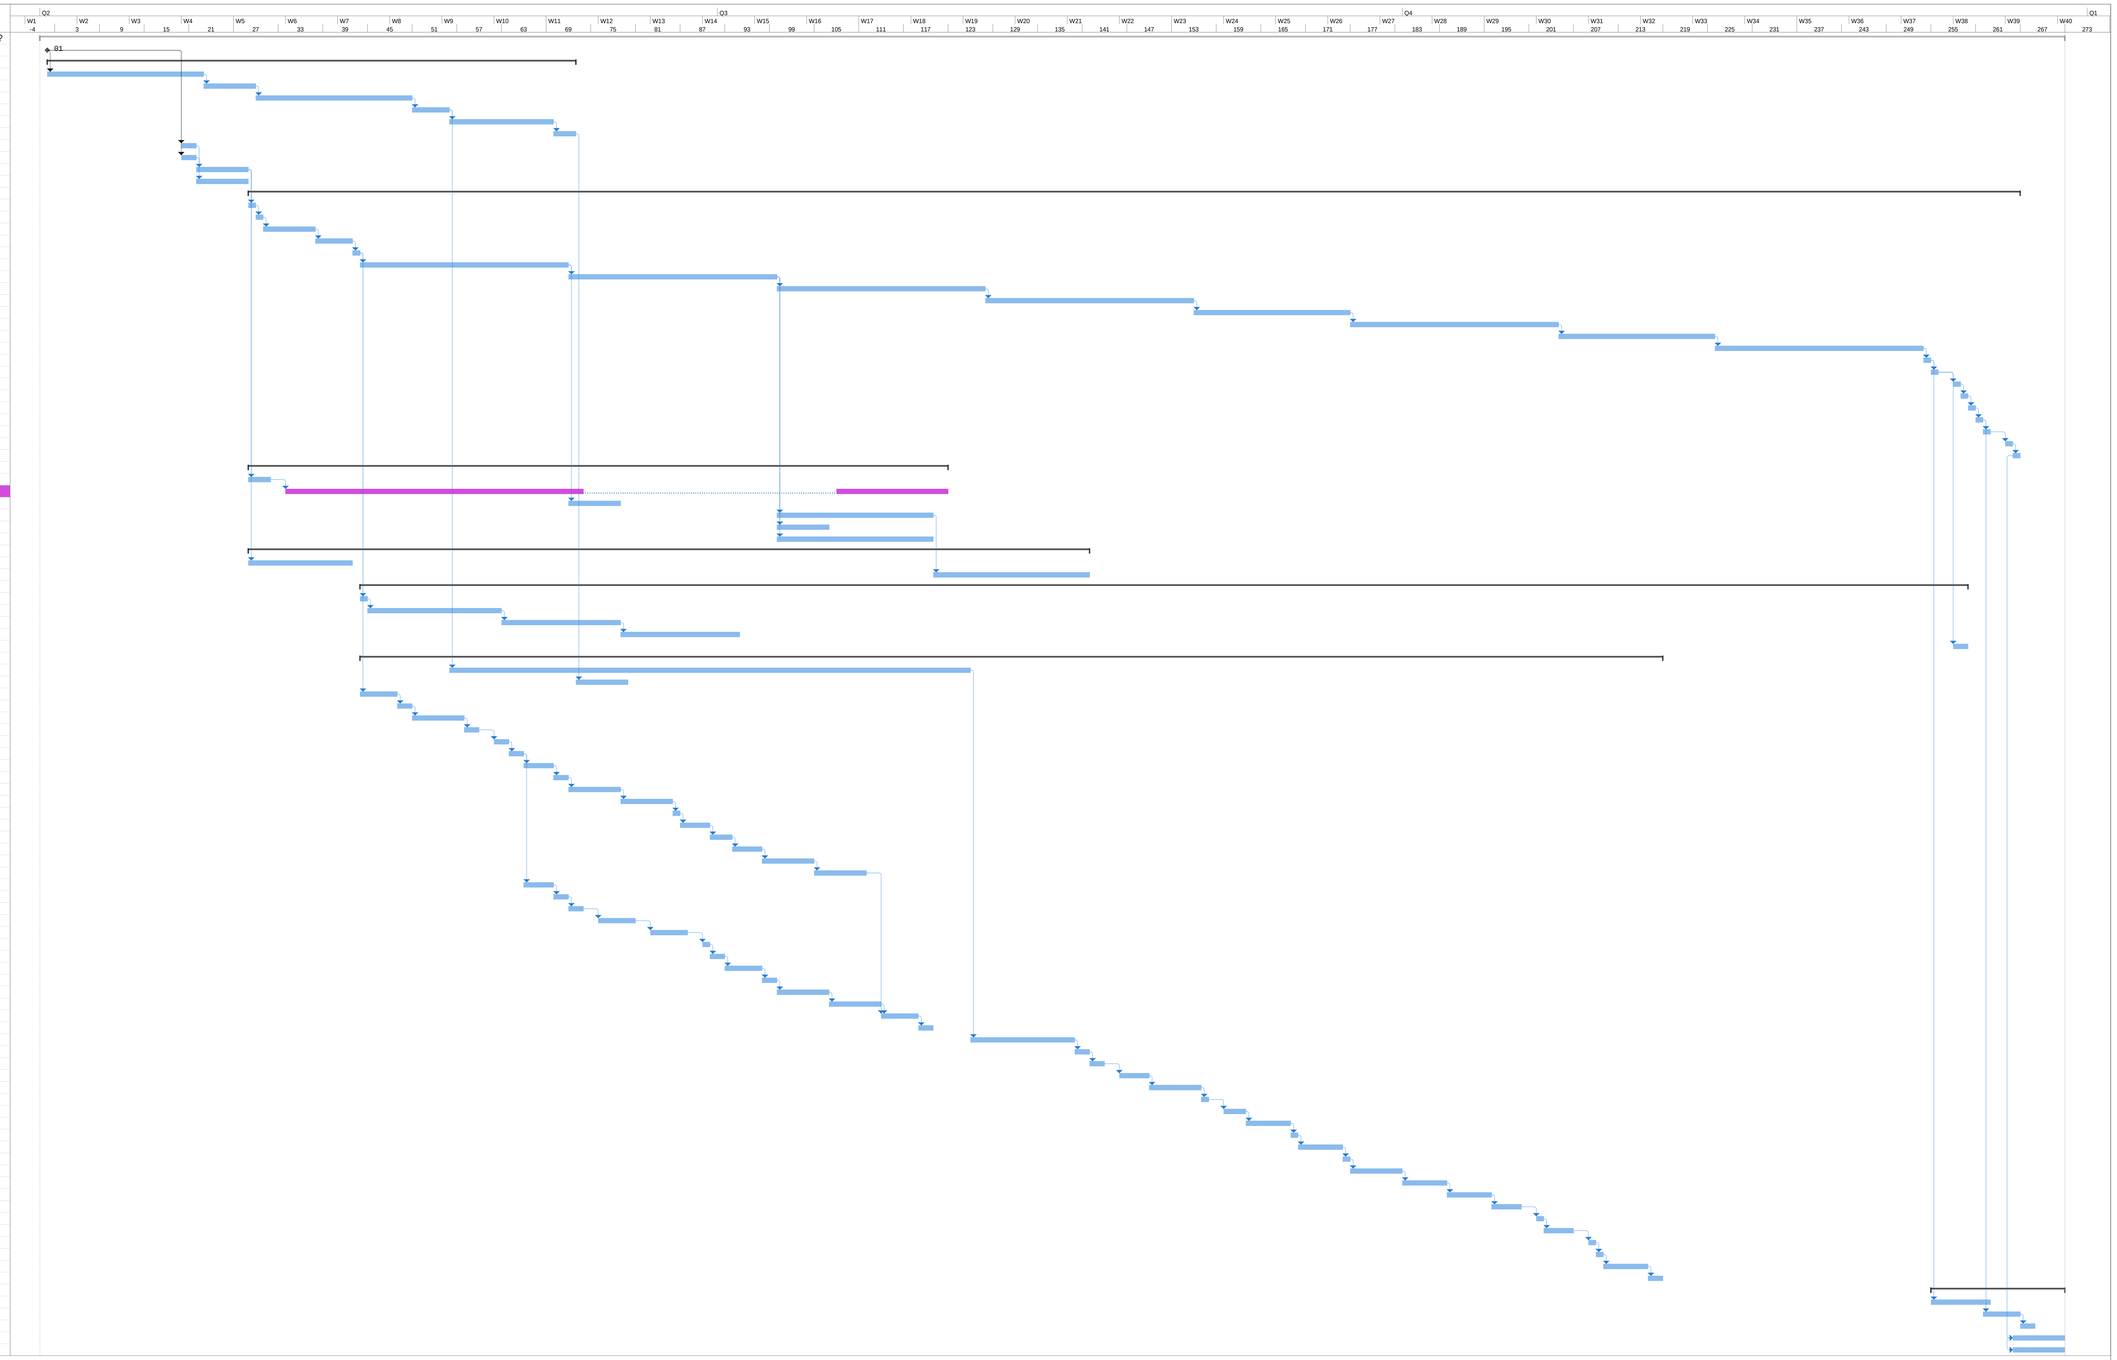


Projekt: 231127_Hauskampstra
Datum: Mon 24.11.25

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
