Neubau Brücke Heuweg

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Veröffentlichung	1 Tag	16.12.2024	16.12.2024
2	Submission	1 Tag	22.01.2025	22.01.2025
3	Vergabe	1 Tag	03.02.2025	03.02.2025
4	**Ingenieurbau**	**160 Tage**	**03.02.2025**	**12.09.2025**
5	Lph 1, Grundlagenermittlung	10 Tage	03.02.2025	14.02.2025
6	Lph 2, Vorplanung	25 Tage	17.02.2025	21.03.2025
7	Lph 3, Entwurfsplanung	30 Tage	24.03.2025	02.05.2025
8	Lph 3, Förderantrag	15 Tage	05.05.2025	23.05.2025
9	Lph 6, Vorbereitung Vergabe	30 Tage	04.08.2025	12.09.2025
10	**Tragwerksplanung**	**160 Tage**	**03.02.2025**	**12.09.2025**
11	Lph 1, Grundlagenermittlung	10 Tage	03.02.2025	14.02.2025
12	Lph 2, Vorplanung	25 Tage	17.02.2025	21.03.2025
13	Lph 3, Entwurfsplanung	30 Tage	24.03.2025	02.05.2025
14	Lph 6, Vorbereitung Vergabe	30 Tage	04.08.2025	12.09.2025
15	**Baubeschluss**	**1 Tag**	**06.05.2025**	**06.05.2025**
17	Abgabe Förderantrag!	1 Tag	30.05.2025	30.05.2025

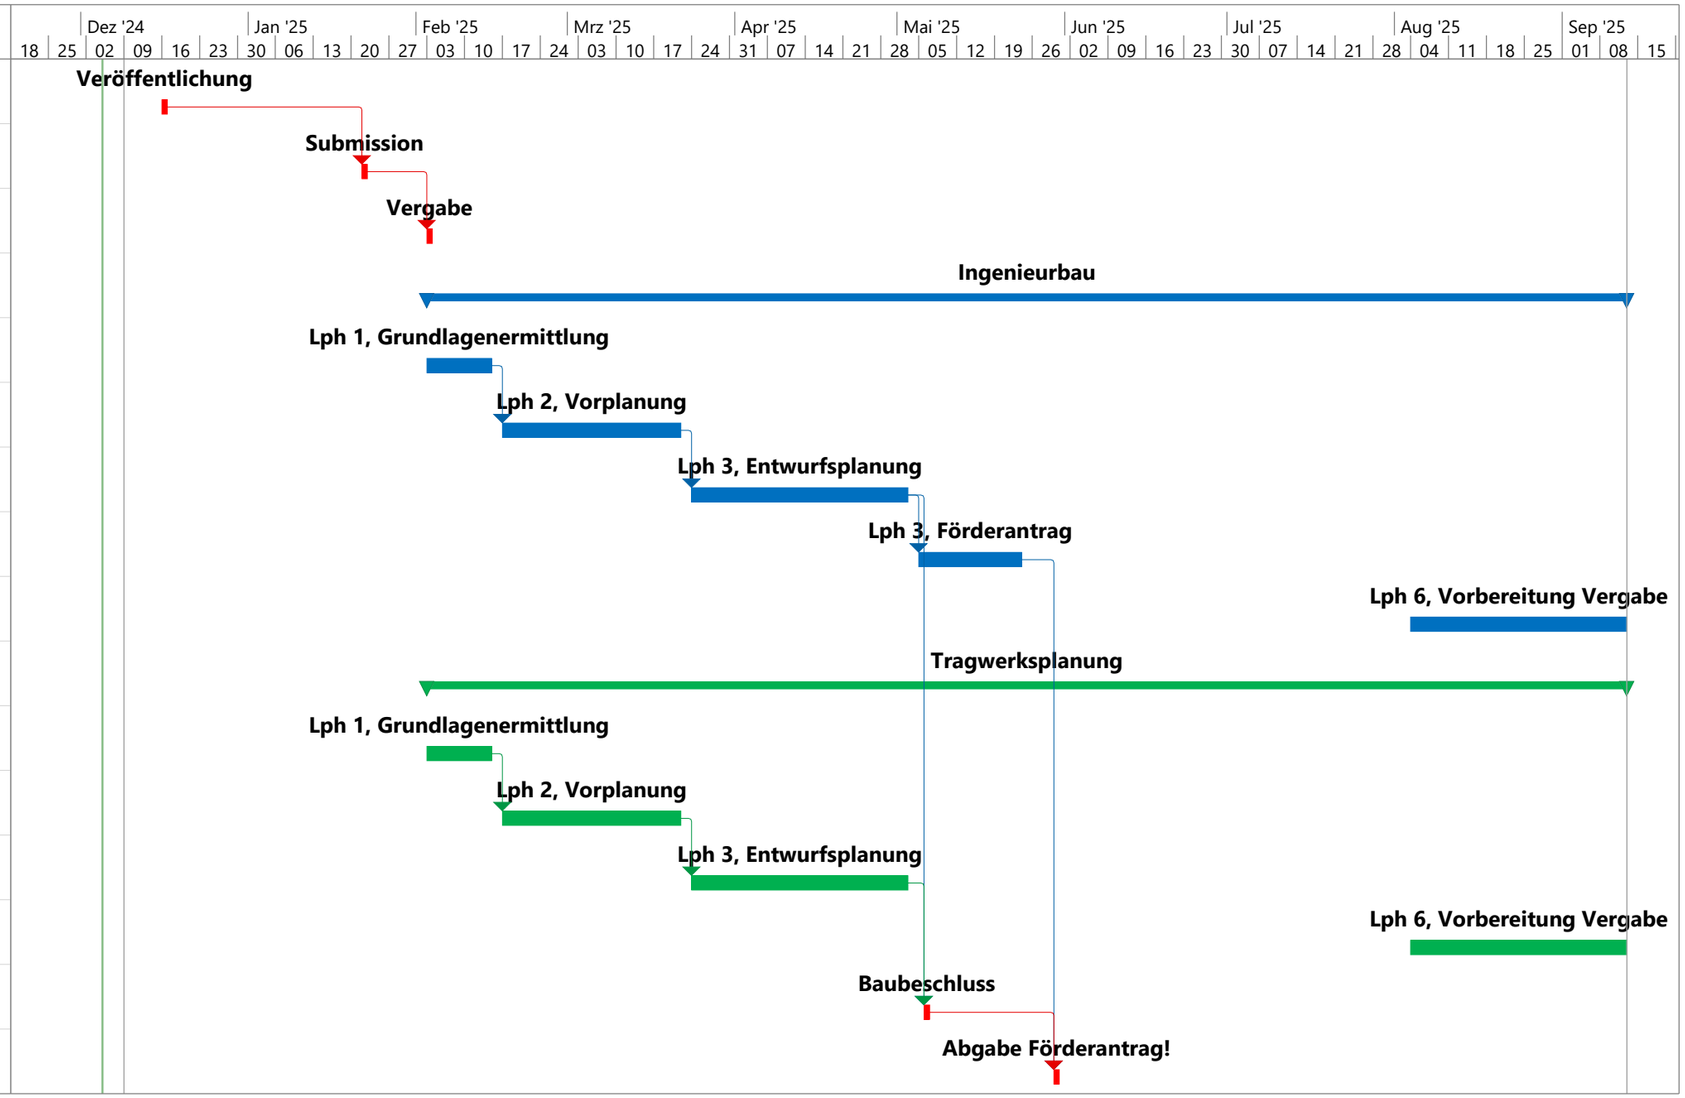

Bauzeitenplan Planung

Anlage 7
